

COMMUNE DE TUBIZE.



PROJET PONT DEMEURE.

Groupe Sentiers.

FINALITES DE L'ENTREPRISE.

Il s'agit d'assurer la liaison du réseau RAVEL 3 au centre de TUBIZE par la rénovation d'un sentier existant.

Dans la brochure du RAVEL 3 Fiche 15 page 62.

On parle de du Musée de la Porte mais aussi des moyens d'accès :

"Y accéder par la route en empruntant le pont en face du village de Clabecq mais faire attention au trafic.

Un autre itinéraire, plus vert sera sans doute ouvert prochainement. Il s'agit d'un petit sentier qui relie le halage de la rive gauche (au départ de l'endroit où deux vieilles péniches sont définitivement amarrées), s'enfonce dans un sous bois, enjambe la Senette et arrive à 800 mètres à peine de l'entrée du musée. Mais que les plus hardis se méfient; un pont en fer est condamné(on parle de le remplacer) sur ce sentier et les abords ne sont pas dégagés....."

OBJECTIFS DU PROJET.

Nettoyage du sentier dans sa totalité.

Construction d'un nouveau pont sur la Senette.

Mise à la disposition par la SARSI, gestionnaire des 30 derniers mètres du parcours, d'un passage vers le quai de halage.

RESULTATS INTERMEDIAIRES.

Résultat 1.

Le nettoyage du sentier sur une largeur de 3 m permettra l'accès au pont en fer des engins de déboisements et de constructions.

Résultat 2.

Le pont de fer vétuste servira de passage temporaire d'une rive à l'autre de la Senette afin de construire un pont dit : "rustique et original" assurant un passage sécuriser aux piétons vélos en mains.

Résultat 3.

Une fois le pont construit une légère rénovation du passage sous le chemin de fer par l'enlèvement des gravats et aménagement de l'accès au quai de halage en coordination avec la SARSI.

RESSOURCES REQUISES.

Déboisement et nettoyage des abords du sentier.

4 hommes durant 15 jours ouvrables.

Matériels pour travaux d'élagages (debrousailleuses, tronçonneuses, haches....

Construction de 2 socles support de pont.

2 hommes durant 10 jours ouvrables.

Matériels pour coffrage des deux piles et 2 m³ de bétons.

Pose du tablier.

4 hommes durant 3 jours ouvrables.

Matériel de cordage simple de l'huile de bras et de l'astuce.

Aménagement du tablier.

2 hommes durant 5 jours ouvrables.

Matériel : Vis, foreuses, planchettes de chêne.

Pose du garde-fou.

2 hommes durant 5 jours ouvrables.

Matériel : Vis, foreuses, planchettes de chêne.

Dégagement des gravats dans le tunnel du chemin de fer.

2 hommes durant 5 jours ouvrables.

Matériel : brouettes, pelles et un peu de maçonnerie..

Aménagement du sentier mis à la disposition de la commune par la SARSI.

2 hommes durant 5 jours ouvrables.

Matériel : brouettes, pelles...

Longueur :
largeur :
Hauteur

Pont métallique à remplacer




Planche chêne 20/150/4

Longueur :
largeur :
Hauteur

Nouveau pont en bois

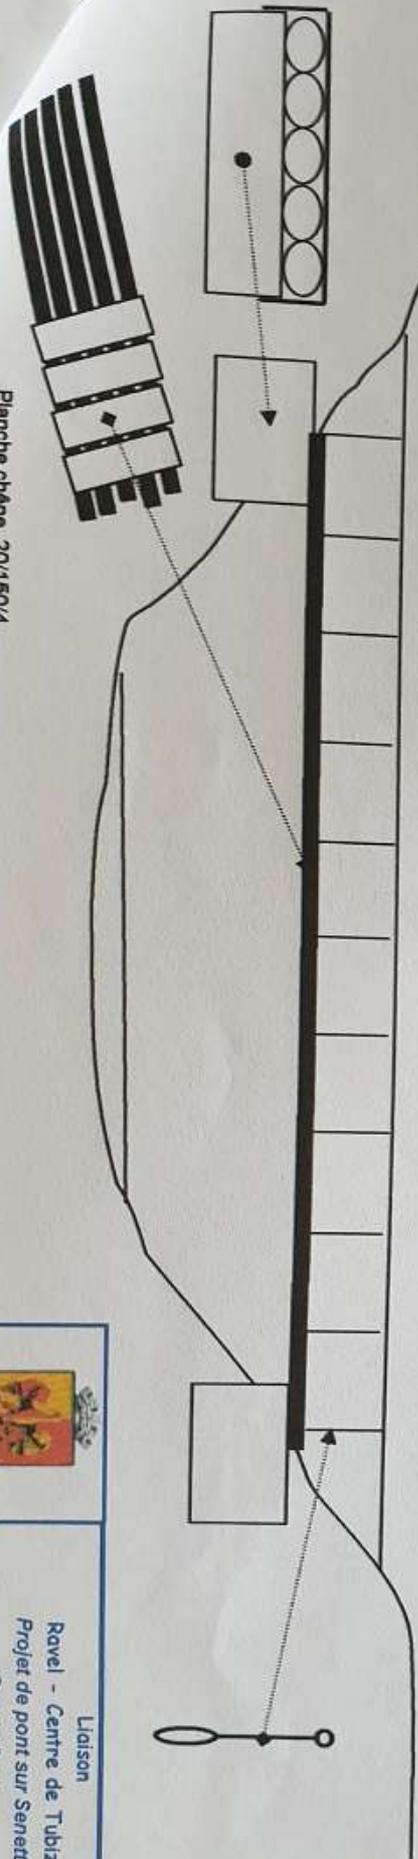


Planche chêne 20/150/4



Liaison
Ravel - Centre de Tubize
Projet de pont sur Senette,
Groupe Sentiers,
11/10/2000

-  Sentier "Pont Demeur"
-  Sentier De Lee
-  Sentier "Demeur bis"

